


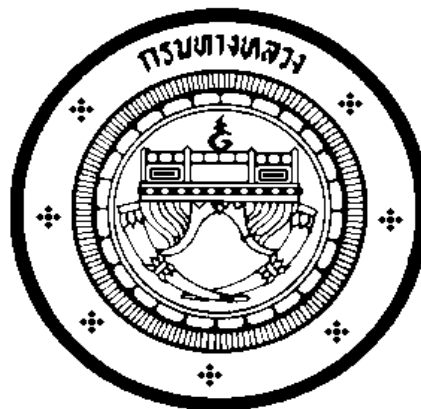

สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่าง ระดับทับช้าง สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ นายชวเลิศ เลิศขวณะกุล นายปรีชา กันณีย์	eb.29 27 ม.ค. 59	1) 516,989,000.00	บริษัท ทิพากร จำกัด	28 ม.ค. 59	1,000				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	
					23 ต.ค. 61	74					
					5 ม.ค. 62	39					
					13 ก.พ. 62						
2	โครงการแก้ไขปัญหาราจรและปรับปรุง ระบบควบคุมงานจัดเก็บบริเวณ ด่านฯ ทับช้าง นายฤกษ์ เพ็ญสมบูรณ์ นายอภิสิทธิ์ กล้าเหม็ง	eb.65 21 มี.ย. 59	1) 715,999,000.00 บริษัท กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โซลูชั่น จำกัด	กิจการร่วมค้า GSET	16 ส.ค. 59	900	8.129	87.230		ติดขัดอุโมงค์ส่งน้ำของ การประปานครหลวงและท่อส่ง น้ำมันของบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ซึ่งได้รับอนุมัติการขยายอายุ สัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างขออนุมัติ ปรับแผนงานใหม่	
					1 ก.พ. 62	22	0.878	100.000			
					23 ก.พ. 19	120	7.251	-12.770	-12.770		
					23 มี.ย. 19						
3	โครงการก่อสร้างถนนบริเวณศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ระหว่าง กม.92+990- กม.94+460	สท.2/33 10 ก.ค. 61	1) 79,748,000.00	บริษัท วีแอล เน็ทเวอร์ค 1996 จำกัด	10 ก.ค. 61	300	2.842	9.413		อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบก่อสร้างให้ สอดคล้องกับสภาพจริงของทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 3701 และการ ขยายระยะเวลาสัญญา	
					5 พ.ค. 62		9.968	55.713			
							-7.126	-46.300	-46.300		

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมถึงปัจจุบัน			
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางหนองขามและด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางโป่ง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี - พัทยา	eb.50 11 ก.ค. 61	25,704,408.00	บริษัท นนทบุรี เอ็นจิเนีย จำกัด	17 ก.ค. 61 11 ก.พ. 62	210				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมถึงปัจจุบัน			
5	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด		9,939,991,756.41				1.283	85.386			
							1.041	82.040			
							0.242	3.346	3.346		
	5.1 ตอน 1 กม.2+300 - กม.5+500	eb.32	1) 738,805,735.00	บริษัท ชัยนันท์ค้า วัสดุก่อสร้าง (2524) จำกัด	1 เม.ย. 59 20 พ.ค. 61 15 ต.ค. 61	780				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1
	นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์	5 กพ. 59									
	5.2 ตอน 2 กม.5+500 - กม.6+900	eb.51	1) 782,320,404.85	บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	4 พ.ค. 59 19 พ.ย. 61	930				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สส.
	นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ นายนิรัตน์ ฉบับตรง	1 เม.ย. 59									
	5.3 ตอน 3 กม.6+900 - กม.10+850	eb.52	1) 671,556,954.30	บริษัท ทิพากร จำกัด	12 พ.ค. 59 28 ต.ค. 61	900				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สส.
	นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ นายนิรัตน์ ฉบับตรง	1 เม.ย. 59									
	5.4 ตอน 4 กม.10+850 - กม.13+900	eb.34	1) 615,492,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่วิศวกรรม	19 ก.พ. 59 9 มี.ค. 61 9 เม.ย. 61	750 31				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1
	นายอนุภาพ เจริญศักดิ์ นายธวัชชัย หมื่นไธสง	8 กพ. 59									

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
	5.5 ตอน 5 กม.13+900 - กม.16+150 นายฉัตรชัย อำนางบุตดี นายประสพ คนงาม	eb.48 31 มี.ค. 59	1) 778,371,000.00	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	20 พ.ค. 59 5 พ.ย. 61	900				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.2
	5.6 ตอน 6 กม.16+150 - กม.21+450 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายราชันย์ เหมวิเชียร	eb.35 8 กพ. 59	1) 883,450,000.00	บริษัท เอส.เค. วาย. คอน สตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59 10 ก.พ. 61 4 มิ.ย. 61	804				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1
	5.7 ตอน 7 กม. 21+450 - กม.24+700 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐ์นิช	eb.55 2 พค. 59	1) 686,869,600.00	บริษัท สี่แสงการ โยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59 22 ก.ค. 61 20 ส.ค. 61	720				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1
	5.8 ตอน 8 กม.24+700 - กม.26 +800 นายสว้าง บุรณธนากิจ นายมนัส สอนไวย	eb.36 8 กพ. 59	1) 701,566,690.00	บริษัท วณิชชัย ก่อสร้าง (1979) จำกัด	22 เม.ย. 59 11 เม.ย. 61 30 พ.ย. 61	720 233				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1
	5.9 ตอน 9 กม.26+800 - กม.29+675 นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์	eb.33 5 กพ. 59	1) 793,166,462.90 19,242,838.36 112,754,787.00	บริษัท วิจิตร ภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	17 มี.ค. 59 2 ก.ย. 61 17 พ.ย. 61 12 เม.ย. 62	1092	2.691	97.929			สท.1
							2.707	94.988			
							-0.016	2.941	2.941		

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
	5.10 ตอน 10 กม.30+625 - กม.32+455 นายสุทัศน์ ยอดแก้ว นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.58 17 พค. 59	1) 886,700,000.00 18,000,000.00	บริษัท กรุงธน เอนิเนียร์ จำกัด	27 พ.ค. 59	900	0.911	96.838			สส.
					12 พ.ย. 61	118	1.031	99.303			
					10 มี.ค. 62	8	-0.120	-2.465	-2.465		
					18 มี.ค. 62						
	5.11 ตอน 11 กม.31+600 - กม.33+450 นายสุทัศน์ ยอดแก้ว นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.59 26 พค. 59	1) 899,500,000.00 10,237,500.00	บริษัท ประยูรวิศร์ จำกัด	7 มิ.ย. 59	1529	3.369	45.364			สส.
					13 ส.ค. 63		1.042	44.818			
							2.327	0.546	0.546		
	5.12 ตอน 12 กม.0+000 - กม.3+150 นายสว่าง บุรณธนานุกิจ นายทนงชัย ดาวนันท์	eb.49 31 มีค. 59	1) 701,388,000.00 5,205,784.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59	870				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.2
					11 ต.ค. 61						
	5.13 ตอน 13 กม.3+150 - กม.6+900 นายศิริศักดิ์ ศรีตระกูล นายทนงชัย ดาวนันท์	eb.50 31 มีค. 59	1) 635,364,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59	900				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.2
					10 พ.ย. 61						

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
5.14	ตอน 14 งานระบบ นายสุวิธาน สุระบาล นายตะวัน ศรีดีตามา		1) 1,862,403,315.02	กิจการร่วมค้า ทริปเปิ้ล เอส.ออฟ	10 ส.ค. 61 29 ก.ค. 61	720	4.705	22.213			กท.
							4.748	13.915			
							-0.043	8.298	8.298		
